Propuesta de despliegue de Medición Inteligente 2027

1. Resumen

- **Prioridad 2027: Córdoba Capital.** 200.000 medidores para capital, de la marca que haya en stock: CLOU cuando hay (no tiene otro destino) y NANSEN para completar. El interior (distritos 28, 8, 18 y 23) es siempre NANSEN y recibe lo que sobra. 93.000 CLOU van a cooperativas.
- **Arranque masivo en marzo 2027** con el primer lote NANSEN (disponible 18/02) en el plan 19.
- **Dos escenarios de capital desde marzo.** Con dos contratistas (14.000/mes, máximo histórico) capital llega a 136.000 en diciembre y termina en abr 28. Con tres (21.000/mes) **capital completa los 200.000 en nov 27**, usando unos 119.429 NANSEN y 60.571 CLOU.
- **El lote CLOU 4 (75.000, disponible 16/12) va en 2028** en cualquier escenario.
- **Interior:** Río Cuarto arranca en julio, Villa María en octubre, San Francisco y Villa Allende en enero 2028. Le quedan 96.299 NANSEN con dos contratistas en capital y 60.571 con tres.
- **Stock de seguridad:** 3 % del acumulado recibido el primer mes, +0,5 puntos por mes, tope 10 %. Al final del despliegue queda el 10 % de cada marca en depósito: 20.000 NANSEN y 10.700 CLOU. Por eso se instala el 90 % de cada cupo.
- **Trifásicos:** entran 80.000 (20 % de cada marca), 70.700 netos de cooperativas, y el cronograma usa entre 33 % y 40 % de esos. Los monofásicos quedan justos.

2. Entregas y reparto

Lotes y plazos según el cronograma de entregas del 21/10. "Disponible" es la fecha de entrega más 20 días (el "VP" del cronograma). El reparto monofásico / trifásico (80 / 20) sale de la orden de compra. Cooperativas: 93.000 CLOU descontados en proporción de cada lote CLOU, de los cuales sólo el 10 % trifásicos (supuestos).

Marca	Lote	Mono	Tri	DCU	Total	Cooperativas (mono / tri)	Neto EPEC (mono / tri)	Entrega	Disponible
NANSEN	1	27.200	6.800	3.000	34.000		34.000 (27.200 / 6.800)	29/01/27	18/02/27
NANSEN	2	24.800	6.200		31.000		31.000 (24.800 / 6.200)	26/02/27	18/03/27
CLOU	1	33.600	8.400	3.000	42.000	19.530 (17.577 / 1.953)	22.470 (16.023 / 6.447)	05/03/27	25/03/27
NANSEN	3	36.000	9.000		45.000		45.000 (36.000 / 9.000)	26/03/27	15/04/27
NANSEN	4	36.000	9.000		45.000		45.000 (36.000 / 9.000)	30/04/27	20/05/27
NANSEN	5	36.000	9.000		45.000		45.000 (36.000 / 9.000)	28/05/27	17/06/27
CLOU	2	33.200	8.300		41.500	19.298 (17.368 / 1.930)	22.202 (15.832 / 6.370)	27/08/27	16/09/27
CLOU	3	33.200	8.300		41.500	19.298 (17.368 / 1.930)	22.202 (15.832 / 6.370)	17/09/27	07/10/27
CLOU	4	60.000	15.000		75.000	34.875 (31.388 / 3.487)	40.125 (28.612 / 11.513)	26/11/27	16/12/27

	NANSEN	CLOU	Total	Mono	Tri	DCU
Entra	200.000	200.000	400.000	320.000	80.000	6.000
Cooperativas	0	93.000	93.000	83.701	9.300	
EPEC	200.000	107.000	307.000	236.299	70.700	6.000

Diferencia con el cronograma de entregas anterior

Hay dos fuentes y no dicen lo mismo. El cronograma del 21/10 da, por lote, un plazo desde el pedido (01/10/2026) más 20 días de "VP", y no distingue monofásicos de trifásicos. La orden de compra da fecha de entrega y cantidades por tipo. Para compararlas en igualdad, acá las dos están en fecha de entrega: pedido más plazo, sin los 20 días.

Lotes: cronograma anterior (gris) contra orden de compra (color), por fecha de entrega

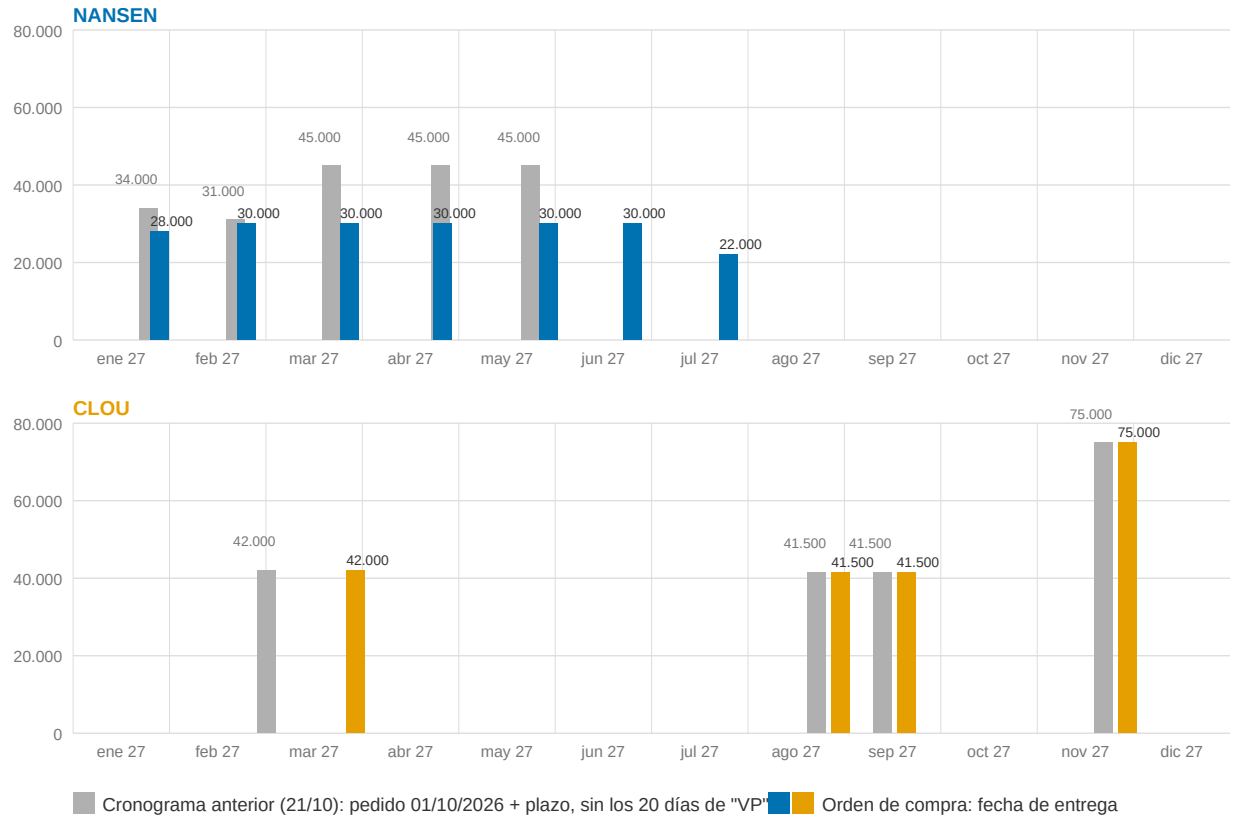

Lote	Cronograma anterior: cantidad / entrega	Orden de compra: cantidad / entrega	Diferencia
NANSEN 1	34.000 / 29/01	28.000 / 25/01	-6.000 medidores, 4 días antes
NANSEN 2	31.000 / 26/02	30.000 / 22/02	-1.000 medidores, 4 días antes
NANSEN 3	45.000 / 26/03	30.000 / 24/03	-15.000 medidores, 2 días antes
NANSEN 4	45.000 / 30/04	30.000 / 23/04	-15.000 medidores, 7 días antes
NANSEN 5	45.000 / 28/05	30.000 / 26/05	-15.000 medidores, 2 días antes
NANSEN 6	no existía	30.000 / 22/06	lote nuevo: 30.000
NANSEN 7	no existía	22.000 / 22/07	lote nuevo: 22.000
CLOU 1	42.000 / 05/03	42.000 / 26/03	21 días más tarde
CLOU 2	41.500 / 27/08	41.500 / 27/08	igual
CLOU 3	41.500 / 17/09	41.500 / 17/09	igual
CLOU 4	75.000 / 26/11	75.000 / 26/11	igual

- **NANSEN: sí son distintos.** El cronograma anterior tenía cinco lotes y la orden tiene siete. Los primeros cinco caen en fechas casi iguales (de 2 a 7 días antes), pero los lotes 3, 4 y 5 traen 30.000 en vez de 45.000. Los 45.000 que faltan llegan en dos lotes nuevos, 22/06 y 22/07. El total es el mismo (200.000), pero NANSEN termina de entrar el 22/07 en vez del 28/05.
- **CLOU: los lotes 2, 3 y 4 son los mismos** (misma cantidad, misma fecha). El lote 1 trae lo mismo pero se entrega el 26/03 en vez del 05/03: tres semanas más tarde.
- **La diferencia no son los trifásicos.** Los trifásicos NANSEN de la orden son 6.000 por lote (4.000 el último), 40.000 en total, y las diferencias por lote son -6.000, -1.000, -15.000, -15.000, -15.000, +30.000 y +22.000: no cierra con entregas sólo de trifásicos. Los lotes se recortaron de otra manera, nada más.

- **Esta propuesta toma los plazos del cronograma** (disponible = entrega + 20 días) y de la orden de compra sólo el reparto mono / tri.

Consecuencias de la curva de entregas:

- **NANSEN entra en cinco lotes, disponibles de feb 27 a jun 27; CLOU en cuatro, de mar 27 a dic 27.** CLOU 1 queda en 22.470 netos: el frente CLOU de capital se queda sin medidores de jun 27 a sep 27 y capital sigue con NANSEN. Si las cooperativas se sirven de los lotes 2 a 4, el bache desaparece.
- **Capital se abastece de NANSEN que estaba pensado para el interior.** Con tres contratistas usa 119.429 NANSEN y al interior le quedan 60.571; CLOU 4 (40.125 netos) queda entero para 2028.

3. Universo: dónde se puede instalar

Distrito	Zona	Vigentes	Ya con MI (CLOU / NSEN)	Chupetes (S) / SG	Posibles cambios	Mono	Tri
1 Córdoba Capital	A	604.728	144.174 / 92.064	62.906 / 2.107	287.356	261.033	26.221
28 Río Cuarto	F	87.775	15 / 22.451	0 / 302	64.909	56.446	7.039
8 Villa María / Villa Nueva	C	62.214	265 / 18.782	0 / 329	42.815	37.467	5.058
18 San Francisco	D	36.440	48 / 1.043	0 / 201	35.118	30.270	4.832
23 Villa Allende / Mendiolaza / Saldán	E	28.814	141 / 2.357	0 / 71	26.229	22.442	3.783
Total		819.971	144.643 / 136.697	62.906 / 3.010	456.427	407.658	46.933

Vigentes: servicio SN con contrato V o servicio FC. Posibles cambios: vigentes sin MI, no chupetes ni SG, tarifa que pasa el filtro y medidor de conexión directa en baja tensión.

Capital por plan

Plan	Posibles cambios	Tri	MI que ya tiene	Relevamiento
19	17.590	1.225	5.610 NSEN	Relevado. Terminar con NANSEN
6	12.380	1.051	268 CLOU	Relevado. CLOU, pegado al 4
18	27.800	1.409	2.582 CLOU + 2.050 NSEN	Relevado
17	25.500	1.890	407 CLOU	Relevado salvo parte subterránea
12	18.880	1.512	6	Parcial (parte pegada al 17)
8	20.490	2.154	20	Falta relevar; SET y parcelas dibujadas
7	25.000	1.700	11	Falta relevar
11	23.690	1.388	290 NSEN	Falta relevar
5	27.330	1.700	132 CLOU	Falta relevar
9 y 10	16.670 / 17.000	1.087 / 949	4 / 3	Falta relevar
14 y 15	25.010 / 23.710	2.858 / 3.481	8 / 8	Sin SET dibujadas: todo subterráneo

Todos los planes, relevados o no, requieren una repasada antes del despliegue para ver puntos nuevos y actualizar.

4. Reglas de la propuesta

- **Capital primero.** El stock se asigna a capital antes que al interior. Capital instala CLOU cuando hay y completa con NANSEN; el interior arranca cuando capital ya está abastecido.
- **Capacidad capital, dos escenarios desde marzo:** dos contratistas con rampa 10.000 - 14.000/mes (14.000 = máximo histórico, marzo a junio 2023), o tres con 15.000 - 21.000/mes.
- **Capacidad interior:** una contratista por distrito, a negociar en base al cupo y al plazo. Se propone Río Cuarto 3.000/mes desde julio, Villa María 3.000/mes desde octubre, San Francisco y Villa Allende 2.500/mes desde enero 2028. Referencia histórica: d8 5.200 y d28 3.700 en su mejor mes; 18 y 23 nunca pasaron de 1.000.
- **Flujo constante:** las contratistas no se quedan sin trabajo; cuando falta una marca se instala la otra.
- **Stock de seguridad** del 3 % subiendo 0,5 puntos por mes hasta 10 %, sobre el acumulado recibido de cada marca. Al final del despliegue queda el 10 % de cada marca en depósito por las dudas: 20.000 NANSEN y 10.700 CLOU. Por eso de cada cupo se instala el 90 %: capital 180.000 de 200.000.
- **Sólo puntos relevados y SET con DCU comunicando.** Primero las SET dibujadas, después el relevamiento de la contratista (corrige la geo y asigna la SET), después el despliegue.

- **No se cambian** los MI existentes, los chupetes (telemedibles S) ni los SG. Electrodependientes, generación distribuida y demás categorías sí se cambian; sólo hay que tener cuidado con el cliente al momento del cambio de equipo. Sólo quedan fuera las tarifas que no pasan el filtro.

5. Cronograma propuesto

Capital: orden de planes

Orden	Plan	Marca	Posibles cambios	Inicio (3 contr.)	Fin (3 contr.)	Inicio (2 contr.)	Fin (2 contr.)	Relevamiento
1	19	NANSEN	17.590	mar 27	may 27	mar 27	jun 27	Terminarlo: ya tiene 5.600 NANSEN; relevado
2	6	CLOU	12.380	abr 27	abr 27	abr 27	abr 27	Pegado al plan 4 (CLOU); relevado
3	18	NANSEN	27.800	may 27	jun 27	jun 27	ago 27	Relevado
4	17	CLOU	25.500	abr 27	oct 27	abr 27	nov 27	Relevado salvo una parte subterránea; tiene concentrador CLOU
5	12	NANSEN	18.880	jun 27	jul 27	ago 27	sep 27	Relevado parcialmente (parte pegada al 17)
6	8	CLOU	20.490	oct 27	nov 27	nov 27	dic 27	Falta relevamiento; SET y parcelas dibujadas
7	7	CLOU	25.000	nov 27	no entra	dic 27	feb 28	Falta relevar
8	11	CLOU	23.690	—	no entra	feb 28	no entra	Falta relevar
9	5	NANSEN	27.330	jul 27	ago 27	sep 27	no entra	Falta relevar; 0 % MI. Va último

"No entra": los posibles cambios de los nueve planes (198.700) superan el cupo instalable de capital (180.000); el último plan de cada marca queda parcial. Con tres contratistas capital usa más NANSEN que CLOU, así que más planes deberían ser NANSEN que los propuestos acá.

Interior

Distrito	Marca	Cupo máx. neto	Capacidad	Inicio	Instalado (2 contr.)	Instalado (3 contr.)	Fin (2 / 3 contr.)
28 Río Cuarto	NANSEN	36.000	3.000/mes	jul 27	36.000	27.571	jun 28 / abr 28
8 Villa María	NANSEN	27.000	3.000/mes	oct 27	27.000	18.000	jun 28 / mar 28
18 San Francisco	NANSEN	18.000	2.500/mes	ene 28	17.999	7.500	ago 28 / mar 28
23 Villa Allende	NANSEN	15.300	2.500/mes	ene 28	15.300	7.500	jul 28 / mar 28

El cupo máximo reparte los 107.000 proporcional a los posibles cambios, con un piso para 18 y 23. Lo instalado es lo que deja el stock NANSEN después de capital.

La propuesta en el tiempo

Línea de tiempo: entregas, planes de capital y distritos (tres contratistas)

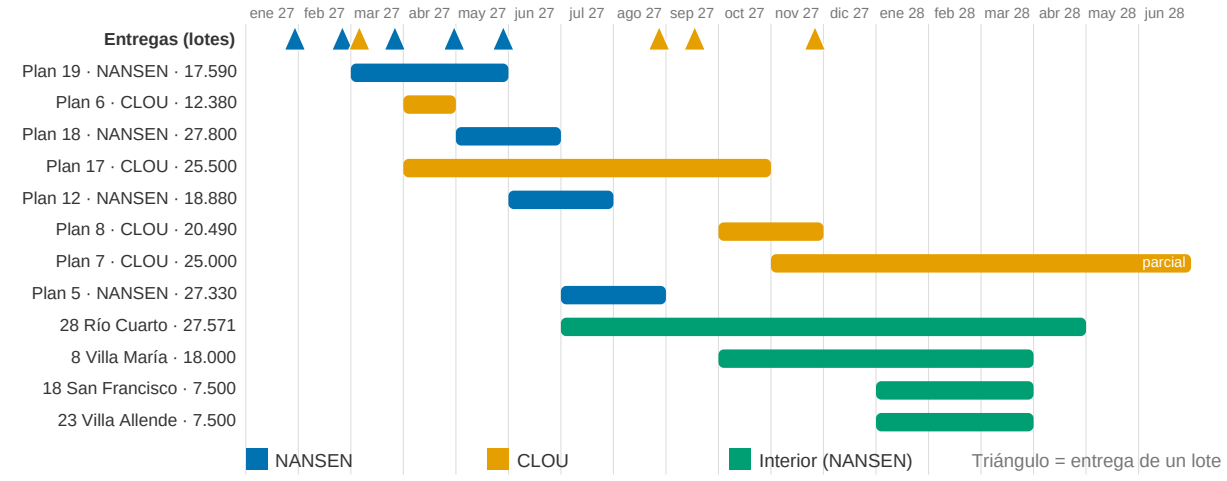

Medidores instalados por mes, tres contratistas en capital

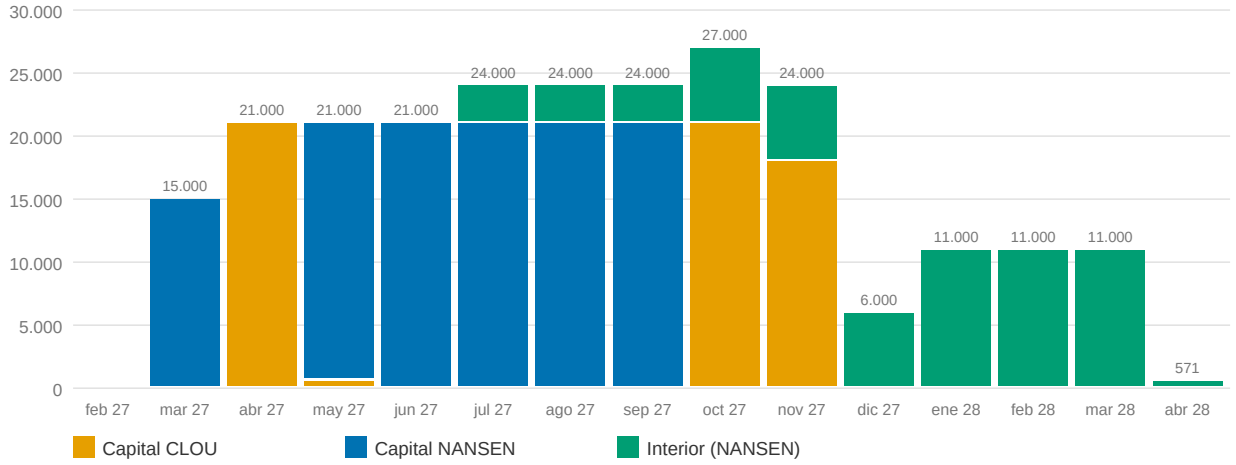

Medidores instalados por mes, dos contratistas en capital

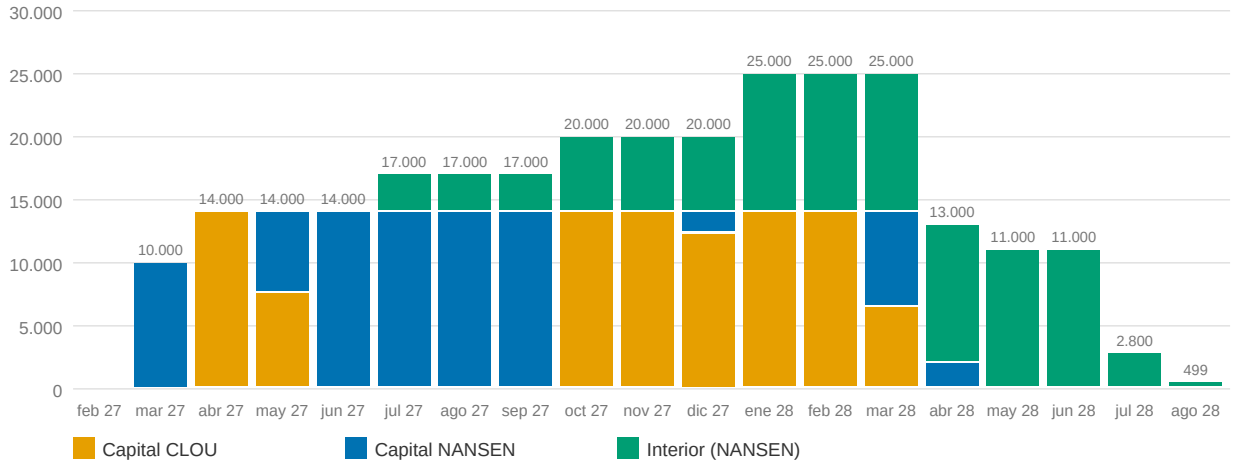

Las barras de capital se apilan por marca; el interior es siempre NANSEN. Los triángulos de la línea de tiempo marcan la fecha de entrega de cada lote.

Mes a mes, tres contratistas en capital

Mes	Cap. CLOU	Cap. NANSEN	Capital	D28	D8	D18	D23	Interior	Total mes	Acum.	Stock NANSEN	Stock CLOU	Seg. %
feb 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mar 27	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	19.000	0	3,0
abr 27	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	36.000	95.000	1.470	3,5
may 27	571	20.429	21.000	0	0	0	0	0	21.000	57.000	74.571	899	4,0
jun 27	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000	78.000	98.571	899	4,5
jul 27	0	21.000	21.000	3.000	0	0	0	3.000	24.000	102.000	119.571	899	5,0
ago 27	0	21.000	21.000	3.000	0	0	0	3.000	24.000	126.000	95.571	899	5,5
sep 27	0	21.000	21.000	3.000	0	0	0	3.000	24.000	150.000	71.571	899	6,0
oct 27	21.000	0	21.000	3.000	3.000	0	0	6.000	27.000	177.000	65.571	24.303	6,5
nov 27	18.000	0	18.000	3.000	3.000	0	0	6.000	24.000	201.000	59.571	6.303	7,0
dic 27	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6.000	6.000	207.000	53.571	6.303	7,5
ene 28	0	0	0	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	11.000	218.000	42.571	46.428	8,0
feb 28	0	0	0	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	11.000	229.000	31.571	46.428	8,5
mar 28	0	0	0	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	11.000	240.000	20.571	46.428	9,0
abr 28	0	0	0	571	0	0	0	571	571	240.571	20.000	46.428	9,5
may 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.571	20.000	46.428	10,0

Mes a mes, dos contratistas en capital

Mes	Cap. CLOU	Cap. NANSEN	Capital	D28	D8	D18	D23	Interior	Total mes	Acum.	Stock NANSEN	Stock CLOU	Seg. %
feb 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mar 27	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	24.000	0	3,0
abr 27	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	24.000	100.000	8.470	3,5
may 27	7.571	6.429	14.000	0	0	0	0	0	14.000	38.000	93.571	899	4,0
jun 27	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	52.000	124.571	899	4,5
jul 27	0	14.000	14.000	3.000	0	0	0	3.000	17.000	69.000	152.571	899	5,0
ago 27	0	14.000	14.000	3.000	0	0	0	3.000	17.000	86.000	135.571	899	5,5
sep 27	0	14.000	14.000	3.000	0	0	0	3.000	17.000	103.000	118.571	899	6,0
oct 27	14.000	0	14.000	3.000	3.000	0	0	6.000	20.000	123.000	112.571	31.303	6,5
nov 27	14.000	0	14.000	3.000	3.000	0	0	6.000	20.000	143.000	106.571	17.303	7,0
dic 27	12.287	1.713	14.000	3.000	3.000	0	0	6.000	20.000	163.000	98.858	5.016	7,5
ene 28	14.000	0	14.000	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	25.000	188.000	87.858	31.141	8,0
feb 28	14.000	0	14.000	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	25.000	213.000	76.858	17.141	8,5
mar 28	6.441	7.559	14.000	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	25.000	238.000	58.299	10.700	9,0
abr 28	0	2.000	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	13.000	251.000	45.299	10.700	9,5
may 28	0	0	0	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	11.000	262.000	34.299	10.700	10,0
jun 28	0	0	0	3.000	3.000	2.500	2.500	11.000	11.000	273.000	23.299	10.700	10,0
jul 28	0	0	0	0	0	2.500	300	2.800	2.800	275.800	20.499	10.700	10,0
ago 28	0	0	0	0	0	499	0	499	499	276.299	20.000	10.700	10,0
sep 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.299	20.000	10.700	10,0

"Stock" es lo recibido menos lo instalado e incluye la reserva. "Cap." es capital por marca.

Comparación de escenarios

	Tres contratistas (21.000/mes)	Dos contratistas (14.000/mes)
Instalados a dic 2027	207.000 (capital 180.000, interior 27.000)	163.000 (capital 136.000, interior 27.000)
Capital termina (180.000 netos)	nov 27	abr 28
Capital: NANSEN / CLOU usados	119.429 / 60.571	83.701 / 96.299
Interior: NANSEN que le quedan	60.571	96.299
Interior termina	abr 28	ago 28
Pico de stock NANSEN en depósito	119.571	152.571

6. Trifásicos

Cada marca entra 80 % monofásico y 20 % trifásico. Los posibles cambios son ~9 % trifásicos en capital y 11 a 14 % en el interior. Los porcentajes son sobre lo que queda para EPEC (netos de cooperativas, suponiendo que se llevan la proporción del lote).

	Entran	Netos para EPEC	Usa el cronograma (3 contr.)	Usa el cronograma (2 contr.)	Todos los posibles cambios
Trifásicos	80.000	70.700	23.597 (33 %)	28.141 (40 %)	46.933 (66 %)
Monofásicos	320.000	236.299	216.974 (92 %)	248.158 (105 %)	407.658 (173 %)

Los trifásicos sobran porque no hay tantos cambios trifásicos: el cronograma usa entre 33 % y 40 % de los que quedan para EPEC, y ni cambiando todos los posibles de los cinco distritos se llega a usarlos todos. Los monofásicos quedan justos: con dos contratistas el cronograma pide 105 % de los que entran. Los NANSEN trifásicos hoy se reutilizan del depósito y vienen con lectura: la lectura inicial en trifásicos es el punto más delicado.

7. Riesgos

Riesgo	Efecto	Qué hacer
SET sin DCU en el plan en curso	Medidores instalados que no telemiden	Lista de SET OK por plan antes de arrancar; no instalar fuera de ella
CLOU 1 reducido por cooperativas	Frente CLOU parado jun 27 a sep 27; plan 17 se estira	Negociar que cooperativas salgan de lotes 2 a 4
CLOU 4 disponible el 16/12	40.125 netos sin tiempo de instalar en 2027	Va en 2028
Capacidad capital < 14.000/mes	200.000 no se alcanza ni en abril 2028	Tercera contratista o reducir cupo capital
Trifásicos de más, monofásicos justos	Stock inmovilizado; faltan mono al final	Ver mix de cooperativas y destino de los tri

8. Dudas y temas a definir

Medidores y entregas

1. **Fechas y lotes.** El cronograma de entregas (21/10) y la orden de compra no coinciden: NANSEN tiene 5 lotes en uno y 7 en la otra (mismo total; la orden termina de entregar el 22/07 en vez del 28/05) y CLOU 1 se entrega el 05/03 en uno y el 26/03 en la otra. Esta propuesta toma los plazos del cronograma y el reparto mono / tri de la orden. ¿Se confirma? ¿Alguien sabe por qué cambiaron los lotes?
2. **¿Qué significa "VP"** en el cronograma (20 días entre entrega y disponible)? La propuesta toma esos 20 días como plazo hasta la cuadrilla.
3. **Trifásicos:** entran 80.000 (20 % de cada marca), 70.700 netos de cooperativas; el cronograma usa entre 33 % y 40 % de esos, y todos los posibles cambios de los cinco distritos suman 46.933 (66 %). ¿Las cooperativas se llevan trifásicos? ¿Hay otro destino (GC, comercios)? Y los monofásicos quedan justos: 236.299 netos para 216.974 a 248.158 instalaciones mono.
4. **Cooperativas:** ¿son todos CLOU? ¿Se descuentan de todos los lotes en proporción, o de lotes puntuales? ¿Cuándo se entregan? Hoy el supuesto deja al frente CLOU de capital sin medidores de jun 27 a sep 27.
5. **¿Quién instala los medidores de las cooperativas?** ¿Es sólo venta o llave en mano? La propuesta asume que no los instala EPEC.
6. **¿Qué proporción de trifásicos se llevan las cooperativas?** No se sabe. La propuesta asume 10 % (9.300 trifásicos y 83.701 monofásicos); si se llevan más, quedan más monofásicos para EPEC.
7. **Stock actual** de medidores por marca y fases, para noviembre a febrero.
8. **Stock de seguridad:** la propuesta reserva un porcentaje de lo que entra (3 % subiendo a 10 %) y deja al final 20.000 NANSEN y 10.700 CLOU. No contempla el parque MI ya instalado (236.000 en capital, 45.000 en el interior): ¿la reserva tiene que cubrir también sus recambios? ¿El 10 % es sobre lo que queda para EPEC o sobre los 200.000 de cada marca?
9. **Chupetes (telemedibles S):** 62.900 en capital; no se tocan en 2027. El plan es sacarlos en 2028: ¿con qué marca y con qué medidores, si el 10 % de reserva es lo único que sobra?
10. **CLOU 4 (75.000, disponible 16/12):** va en 2028.
11. **Concentradores:** 3.000 por marca, llegan con el primer lote de cada una; destino no definido. La cantidad de SET por plan varía con el tamaño del plan y la edificación.

Capital y planes

12. **Orden propuesto 19 - 6 - 18 - 17 - 12 - 8 - 7 - 11 - 5** (5 al último): ¿se acepta?
13. **Marca por plan:** la define Técnica por el DCU de cada SET, y sólo se despliega en SET con DCU comunicando. Lo propuesto acá es tentativo. Con tres contratistas capital necesita unos 119.429 NANSEN: más planes NANSEN que los propuestos.
14. **Repasada de los planes:** todos, relevados o no, requieren una repasada antes del despliegue para ver puntos nuevos y actualizar.
15. **¿Capital toma NANSEN del interior cuando falta CLOU?** La propuesta asume que sí; es lo que hace que capital cierre en 2027 con tres contratistas.
16. **Planes 14 y 15** (todo subterráneo, sin SET dibujadas): ¿quedan fuera de 2027?
17. **Lista de SET con DCU OK por plan:** el Trello no lo usa Técnica, sólo sirve para la parte del relevamiento.

Interior

18. **Reparto y cupo.** Propuesto 40.000 / 30.000 / 20.000 / 17.000 brutos (28, 8, 18, 23). Con tres contratistas en capital, al interior le quedan 60.571 NANSEN; con dos, 96.299. ¿Se acepta que el interior es lo que sobra?
19. **Orden y arranque:** ¿Río Cuarto primero en julio? ¿18 y 23 recién en 2028?
20. **Capacidad de cada contratista del interior:** a negociar en base a cupo y plazo. ¿Hay contratista para 18 y 23?
21. **SET del interior:** primero se requieren las SET dibujadas; el relevamiento después.

Capacidad y contratistas

22. **Capital:** ¿las dos contratistas confirman 14.000/mes entre ambas? ¿Es viable una tercera desde marzo, o ampliar las dos a 21.000/mes?
23. **Rampa de marzo** (10.000 o 15.000): ¿arrancan con capacidad plena o hay que contar capacitación de las contratistas nuevas?
24. **Si no se llega a 200.000 en capital en 2027,** ¿la propuesta declara que requiere hasta abril 2028, o se reduce el cupo de capital?
